



*Mitreden - Mitgestalten
- Mitfeiern -*

Information

Thomas Kapplmüller – Projektkoordinator

... und Diskussion

Pfr. Leonard Ozougwu, Thomas Hinterholzer, Stefan Kapplmüller

Erstfassung, Diskussion – 03/2024 – bis Seite 15

1. Aktualisierung – 11/2024 – Seiten 16 bis 31

2. Aktualisierung – 05/2025 – Seite 32 bis 47





Warum das alles überhaupt?

Aus Sicht des Hausbesitzers: Dass es nicht hineinregnet. Dass Schäden ausgebessert und weitere, teure Schäden verhindert werden. Dass es warm und hell genug ist.

Mit den Augen des Vereinsvorstandes: Ein schönes Clubhaus ist Basis für einen guten, erfolgreichen, gern und zahlreich besuchten Verein.

Mit der Sendungs- und Generationen-Brille: Der gemeinsame Weg der Kirchensanierung kann helfen, mehr / neue Menschen zu „fischen“. Die Junge Kirche einbinden sichert Interesse und Mitwirken der Jungen.

Liturgisch betrachtet: Dass besseres, gemeinsames Feiern und Beten ohne Ablenkung möglich ist.



Und da stehen wir 11/2024:

~~die gestrichenen Passagen waren Stand 03/2024~~

170 ~~90~~ Personen haben sich als „Helfenden Hände“ für das Sanierungsprojekt bereits registrieren lassen.

Spenden und Spenden-Zusagen über Euro 420.000
~~250.000~~ liegen bereits vor.

~~Der Antrag für~~ die erste Bau-Etappe ist ~~an die Diözese~~
~~eingereicht~~ begonnen.



RW
PS3 -> PS4
Beton Kreis 150
Friedhofstraße
KR



Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)



Befund Fa. Weihartner – Statik und Konstruktion – Dezember 2022

- Reparaturmaßnahmen im Dachstuhl
 - Mauerbänke in Stand setzen
 - Trame verstärken
- Sicherungsmaßnahmen im Gewölbe.
- Dachraum umfassend entrümpeln.
 - Gefahr der Verfrachtung von Schadstoffen



Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)



Befund Glaswerkstatt Urbanek – Fenster – November 2022

- 12 Glasbrüche an den Fenstern reparieren.
- Gründliche Generalwartung aller Fenster
 - Reinigen, Rahmen entrostern, grundieren
- Sakristei-Fenster neu versetzen.
- Risse in der Fensterfassung beheben.



Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)



Kamerabefahrung Fa. Zaussinger – Kanäle – Dezember 2022

- Gravierende Beeinträchtigungen in der Ableitung von Oberflächenwässer.
 - Zahlreiche Verstopfungen
 - Wurzelwuchs oder Ablagerungen
 - Rohbrüche und Leitungsverschiebungen
- Bauliche Priorität 1.



RW_RR7 -
ES1_6aaf3b30-eed3-4425-86e2-8da639d713ed_20221214_1
15634_616.jpg, 00:03:16, 2.89m



Bauliche und liturgische Kommentare

Befunde und Gutachten (extern)



Diverse interne Gutachten der Abteilung Kirchliches Bauen

- Elektroheizung
- Elektroinstallation inkl. Schaltschrank
- Kirchenglocken



... ein bisschen Projekt-Organisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten

... ein bisschen Projektorganisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



Der Steuerkreis

- Koordiniert die Tätigkeiten der Arbeitsgruppen, berichtet an PGR
- Pfarrer Leonard Ozougwu, Elisabeth Bichelmaier, Stefan Kapplmüller, Thomas Hinterholzer (ArGr), Thomas Kapplmüller (ArGr / Projektkoordinator)

Arbeitsgruppe Raum

- Sammelt durch Besuch von Pfarren mit sanierter Kirche Inspirationen für unser Vorhaben. Bauliche und liturgische Gutachten, bilden ebenfalls wesentlichen Input für die weiteren Beratungen. *Jetzt Pause.*
- Gesprächspartner: Liturgieausschuss, MesnerInnen, Abteilung Kirchliches Bauen (AKB) Linz, Denkmalschutz, Fachleute und Auskunftspersonen der besuchten Pfarren.

... ein bisschen Projektorganisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



Arbeitsgruppe Bau

- Koordination aller Bautätigkeit.
- Abstimmung zwischen Professionisten und „Helfenden Händen“
 - Hände
 - Gerätschaft
 - Verköstigung
- Leitung Thomas Hinterholzer
 - Unterstützt von Johann Kaufmann

... ein bisschen Projektorganisation

Das Wer und Wie unserer Tätigkeiten



Offene Themen

- Projektnummer beim BDA für Spendenabwicklung ...**wird jeden Moment erwartet**; schriftliche Projekt-Bestätigung liegt schon vor.
- Finanzkammer-Direktoren-Konferenz arbeitet an Gesetzesvorlage für Bischofskonferenz / Absetzbarkeit von Spenden an Kirchen
 - **Neuvorlage 2025 ... in Arbeit**
- Leiter für ArGr Geld
 - Nach internem Wechsel ist die Stelle **vakant**.

Kontaktdaten

- Konto Raiba Aist / Schwertberg: AT91 3446 0000 0602 0127
- Projektkoordination 0699 1620 3880 - thomas.kapplmueller@engel.at
- Pfarrbüro 07262 61209; pfarre.schwertberg@dioezese-linz.at





Vom lieben Geld

Kostenschätzungen und Budgetierung

Vom lieben Geld

Kostenschätzungen und Budgetierung



Wir müssen (rund EUR 650.000)

Kanal

Reparaturen Dachraum, Dachstuhl

Gewölbe, statische Maßnahmen

Fenster- inkl. Steinsanierung

Erneuerung Elektrotechnik

Ausmalen inkl. Nebenaufwände

Sanierung Glocken

Planung, Projektanten u. ä.

Wir wollen (rund EUR 750.000)

Bankheizung

„Kapelle“ unter der Empore

Kirchenbänke sanieren, anordnen

Sakristei + Grafenstuhl adaptieren

Altarraum anpassen

Technik (Licht, Medien, Beamer)

Altar-Vorplatz mit Rampen

Alle Kosten basieren auf Experten-Schätzung, nicht auf Angeboten.

Eigenleistung und Baukostenindex (entsprechend tatsächlichem Realisierungszeitpunkt) sind nicht berücksichtigt.

Wo stehen wir heute

Was sind die nächsten Etappen



Bauantrag an AKB

- Der erste Antrag + Begleitschreiben ist abgeschickt
 - Für die Etappen **01** + **02** (da bereits > EUR 250.000 Spenden vorhanden oder zugesagt sind).
 - Bitte, sehr rasch in Sachen BDA voranzuschreiten.

Meilensteine 2024

- Mai – AKB
Bauantrag gem. Ansuchen der Pfarre ist bewilligt
- Oktober – Steuerkreis
Abgleich Einnahmen-Entwicklung [Plan : Ist]
inklusive möglicher notwendiger Folge-Entscheidung



Projektstand November 2024

Endlich geht es los ...

Projektstand November 2024

Endlich geht es los ...



Spatenstich-Feier Erntedank 2024

- Alle sind dabei
 - Pfarre
 - Gemeinde
 - Wirtschaft
 - Vereine
 - Helfende Hände



Projektstand November 2024

Endlich geht es los ...



Bauetappe 1 hat begonnen

- Beinhaltet
 - Sanierung Kanäle ... in Arbeit
 - Entrümpeln Dachraum ... Eigenleistung
 - Reparaturen Dachstuhl, Dachdeckung, Glocken ... vor Beauftragung
- Genehmigung BDA liegt seit Juli vor
 - Sobald auch eine Projekt-Nummer formal vorliegt, kann über BDA Steuer schonend gesponsort werden
- Gesamtkosten aktuell 168T Euro
 - Zuschuss Diözese 42T Euro
 - Zusage Gemeinde von gesamt 100T Euro / davon erstes Drittel KJ2024
 - Sponsoren sind gefunden für Rohr-Material Kanäle und Elektrik Glocken (stammt aus den 60er Jahren)

Projektstand November 2024

Bauetappe I - Kostenschätzung



Von der Diözesanfinanzkammer bezuschussbare Kosten inkl. Ust.:		DIÖZESE LINZ DIÖZESANBES BAUEN 4020 Linz, Trautnerstraße 18		168.000,00 EUR
Unterschrift mit Datum der Erstaussstellung: Dies ist keine kirchenbehördliche Genehmigung.		05.03.2024		
Bezeichnung der Arbeit	bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	NICHT bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	Anmerkung	
Baumeister				
Allgemein	50.000,00	0,00	Kanalsanierung	
Summe:	50.000,00	0,00		
Dachdecker - Spengler				
Allgemein	50.000,00	0,00		
Summe:	50.000,00	0,00		
Eigenleistungen Bauherr				
Robotleistungen	5.000,00	0,00		
Summe:	5.000,00	0,00		
Sonderfachleute				
Statik	3.500,00	0,00		
Bau- und Planungsordinator (BauKG)	2.500,00	0,00		
Örtliche Bauaufsicht	11.000,00	0,00		
Summe:	17.000,00	0,00		
Unvorhergesehenes				
Allgemein bezuschussbar	13.500,00	0,00		
Summe:	13.500,00	0,00		
Zimmermann				
Dachkonstruktion	32.500,00	0,00		
Summe:	32.500,00	0,00		
GESAMTSUMMEN inkl. Ust.	168.000,00	0,00		
GESAMTKOSTEN inkl. Ust.:			€ 168.000,00	

Projektstand November 2024

Endlich geht es los ...



Bauetappe 1 – Sanierung Kanäle

- Komplette Befreiung von Bewuchs



Projektstand November 2024

Endlich geht es los ...

Bauetappe 1 – Sanierung Kanäle

- Freilegen schadhafter Stellen



Projektstand November 2024

Spenden und Zusagen 2024 + 2025



Plan – Ist – Vergleich (ohne öffentliche Hand)

- Großspender + Wirtschaft ... 150%
 - Und noch ein paar Eisen im Feuer
- Hausbesuche ... 40%
 - Besuchsquote aktuell 30-35%
- Vereine inkl. gewidmete Veranstaltungen ... 80%
- Pfarrliche Veranstaltungen, Kollekten, Begräbnisse (nur inkl. 2024) ... 150%

- Gesamtsituation Oktober 2024
 - Plan 350T – Ist 300T

Projektstand November 2024

Spenden und Zusagen 2024 + 2025



Vorschau 2025

- Bereits zugesagte Veranstaltungen
 - Tarockkurs – KMB - Jänner + Februar
 - Lichtbildvortrag – Fotoclub – 19. März
 - Konzert – Musikverein – 5. April
 - Konzert – Jagd und Horn – Jägerschaft - 27. Juni
 - Frühschoppen / Tennisturnier – Union Aisthofen Weinzierl – Termin ?
 - Konzert Gig – QV2 – Termin ?
- Sponsorgespräche
 - Z.B. alle Versicherungen (hatten wir noch nicht auf dem Radar)

Projektstand November 2024

Baustappe 2 - Kostenschätzung



Von der Diözese bezuschussbare Kosten inkl. Ust.:

250 000,00 EUR

DIÖZESE LINZ
DIÖZESANES BAUEN
 4020 Linz, Hainhoferstraße 18

Unterschrift mit Datum der Erstaussstellung:
 Dies ist keine kirchenbehördliche Genehmigung.

26.08.2024

Bezeichnung der Arbeit	bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	NICHT bezuschussbare Kosten in EUR inkl. Ust.	Anmerkung
Elektroinstallation			
Allgemein	15 000,00	0,00	Fensterlüftung und Steuerung
Summe:	15 000,00	0,00	
Restaurierungen			
Kirchenfenster inkl. Schutzverglasung	165 000,00	0,00	
Stein	25 000,00	0,00	Fensterleibungen
Summe:	190 000,00	0,00	
Schlosser			
Allgemein	10 000,00	0,00	Gitter bei Emporenfenster
Summe:	10 000,00	0,00	
Sonderfachleute			
Bau- und Planungskordinator (BauKG)	3 500,00	0,00	
Örtliche Bauaufsicht	10 500,00	0,00	
Summe:	14 000,00	0,00	
Unvorhergesehenes			
Allgemein bezuschussbar	21 000,00	0,00	
Summe:	21 000,00	0,00	
GESAMTSUMMEN inkl. USt.	250 000,00	0,00	
GESAMTKOSTEN inkl. Ust.:			€ 250 000,00


Diskussion

Bauetappe 4



Das wünschen wir uns

- Bedarf jedoch der Freigabe von AKB und BDA


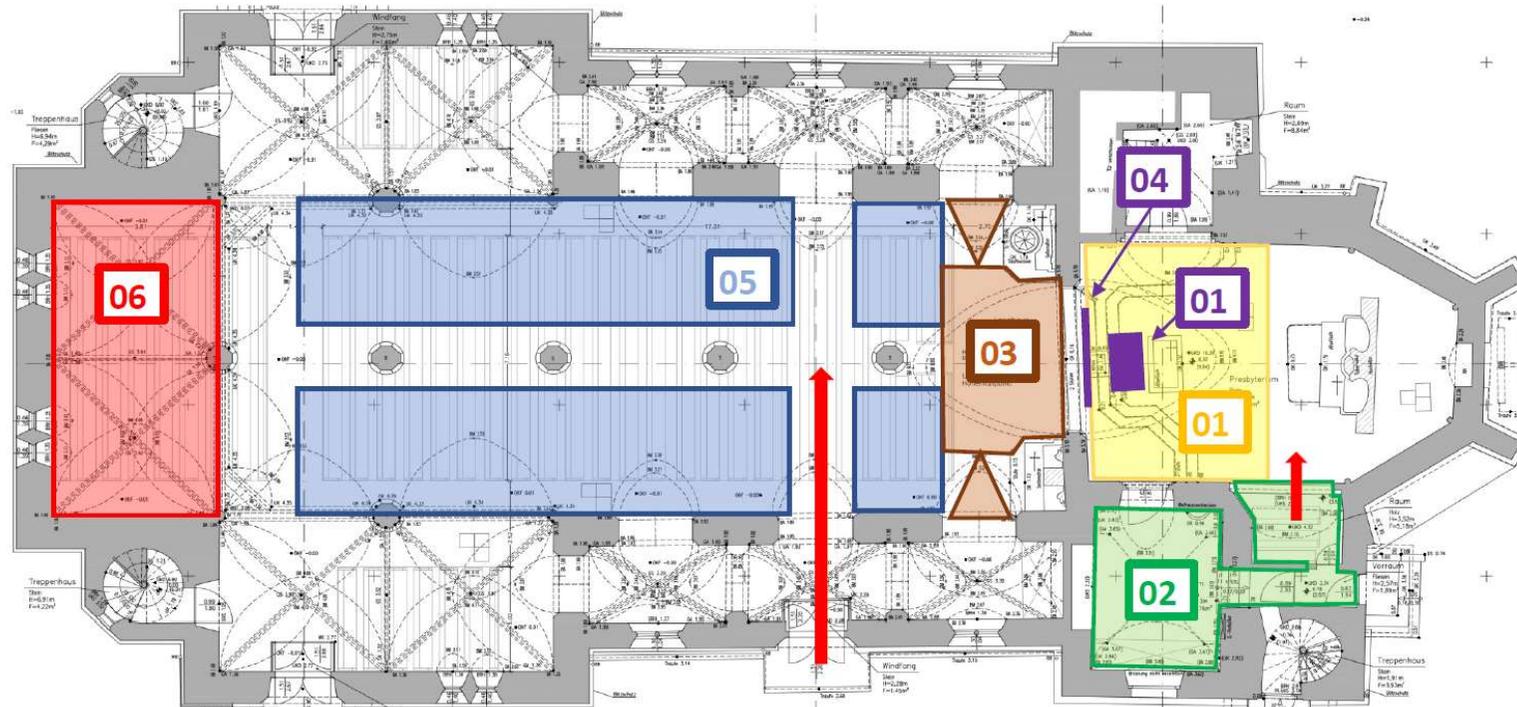


Bauliche und liturgische Kommentare

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Das wünschen wir uns

- **01:** Volksaltar näher ans Volk
Altarraum so gut als möglich Stufen-frei vergrößern
- **02:** Sakristei und Grafenstuhl niveaugleich + neuer Ausgang in den Altarraum.
 - Mehr Platz und größere Bewegungsfreiheit für Vorbereitung und Gottesdienst
 - Keine Kästen mehr an der Außenwand (Schimmel)
 - Wasserleitung mit Abfluss wünschenswert


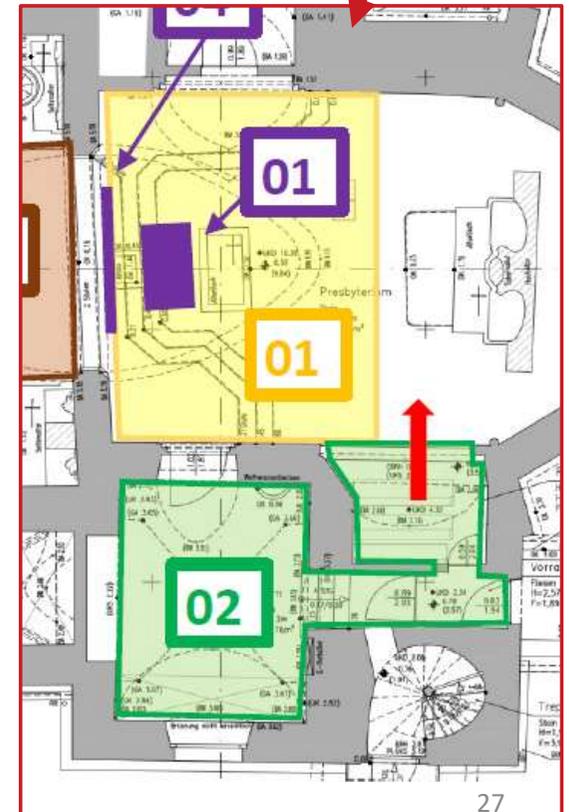
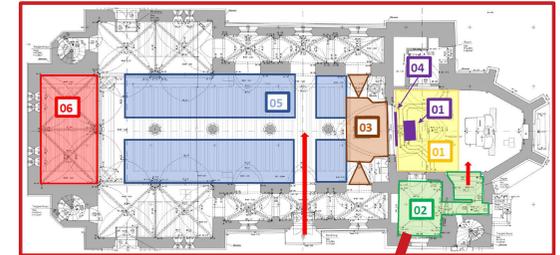


Bauliche und liturgische Kommentare

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Das wünschen wir uns

- **03**: leicht erhöhter, Stufen-freier Vorplatz zwischen Altarraum und Kirchenbänken; beidseitig Rampen (Rollstuhl-tauglich).
- **04**: zentrale, abrollbare Leinwand
Beamer-Projektion von Säule 1.

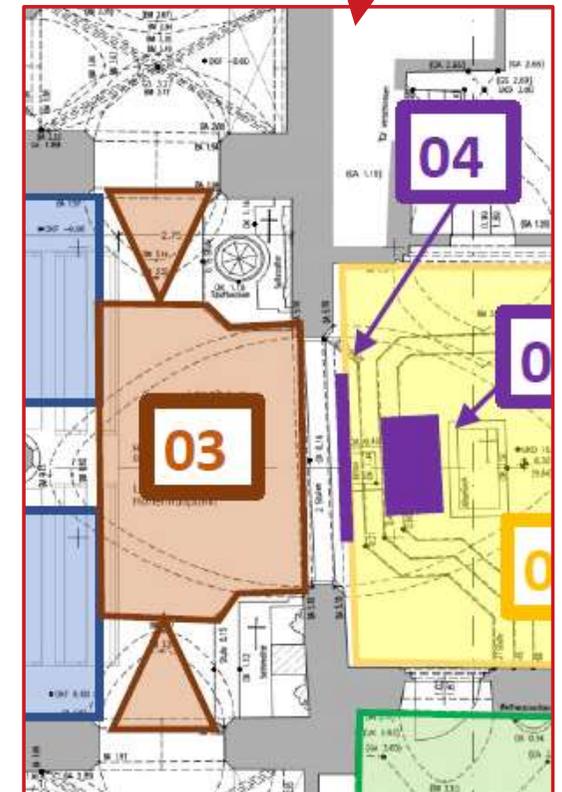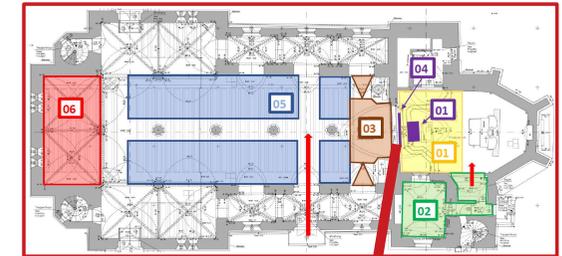
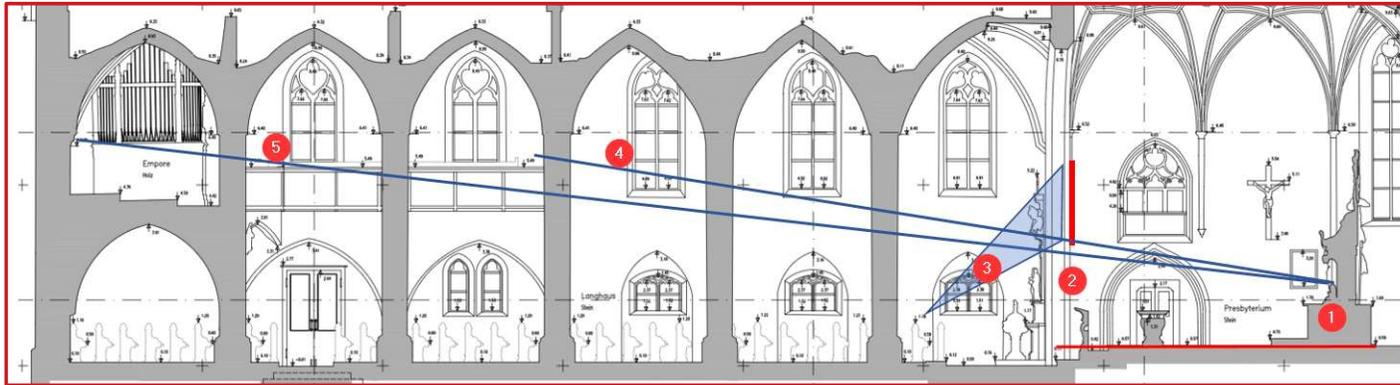


Bauliche und liturgische Kommentare

Eindrücke und Feststellungen (eigene)

Das wünschen wir uns

- **05:** kreuzförmiger Gang im Hauptschiff / Bänke teilen und auflockern.
- **06:** offener Andachtsraum unter Orgelempore / flexible Bestuhlung / Infrarot-Wandheizung installieren.

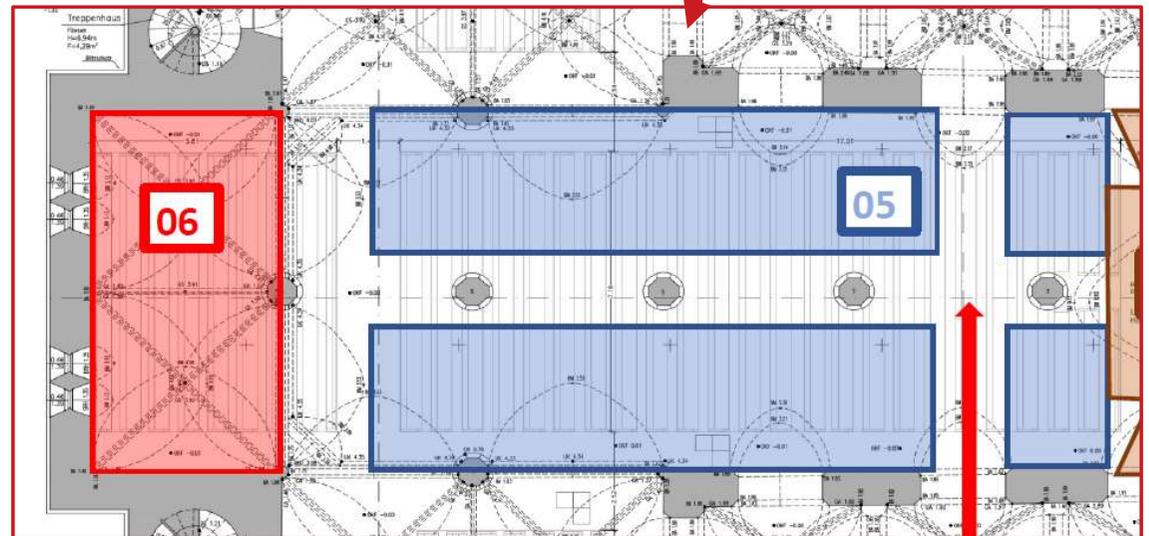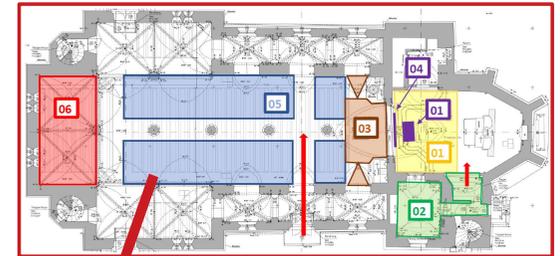

- Im Hauptschiff sehen dann gleich viel Besucher zum Altar wie heute.
- Gangbreite li. / re. der Säulen wie derzeit an den Bankreihen außen.
- Intime Atmosphäre im Andachtsraum durch geringe Raumhöhe.

Diskussion

Baustappe 4

3D-Animation der HTL-Schüler

- Erarbeitet von
 - Prof. Josef Lichtenberger
 - Lion Hochbichler + Luca Cantarutti
- https://orbix360.com/Ou_OfJuu0





Diskussion

Fragen, kritische Anmerkungen, Antworten,
Hilfszusagen ...

Alles ist möglich und erwünscht.

Handzeichen erbeten 😊



Themenparkplatz ist vorhanden.



Projektstand Mai 2025

Du hast bisher nichts oder wenig gesehen? Doch schon viel ist geschehen!!

Projektstand Mai 2025

Bundesdenkmalamt (BDA) ist an Bord



Projekt-Nummer A479

- Im Februar 2025 wird für „Sanierung Dach/Dachstuhl“ vom BDA endlich „unser“ Spendenkonto eröffnet.
 - Ab sofort können natürliche Personen und Unternehmen steuerbegünstigt an das BDA-Konto spenden (siehe nächste Seite).
 - Thomas Kapplmüller ist von der Pfarre dem BDA gegenüber als „Spendenbeauftragter“ genannt.
- Für natürliche Personen (Arbeitnehmerveranlagung) werden die Sonderausgaben vom BDA an das Finanzamt gemeldet.
- Bestätigung für betriebliche Spenden bitte anfordern bei spenden@bda.gv.at

Projektstand Mai 2025

Bundesdenkmalamt (BDA) ist an Bord

Formaler Anforderungen
für steuerbegünstigte
Spenden

AT **BAWAG PSK** BAWAG PS K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft **ZAHLUNGSANWEISUNG**

EmpfängerIn Name/Firma
Bundesdenkmalamt, 1010 Wien

IBAN EmpfängerIn
AT07 0100 0000 0503 1050

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank
BUNDATWW

Kann bei Zahlungen innerhalb EU/EWR entfallen

EUR Betrag

Wenn Sie Ihr Geburtsdatum, Vor- und Nachname angeben, werden Ihre Spenden automatisch steuerlich berücksichtigt. Bitte füllen Sie alle Daten leserlich aus - vielen Dank

Geburtsdatum
TITMMJ13

Name Vor- und Nachname

Aktionscode PLZ
A479

Adresse Ort, Anschrift

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn

KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma

006

30+ Betrag Beleg

Unterschrift ZeichnungsberechtigteR

Pflicht-Daten: Aktionscode, Geburtsdatum, Vor- + Nachname (wie Meldezettel)

- Bei Verwendung eines „Spenden-Erlagscheins“ richtig eintragen
- bei Online-Überweisung in „Verwendungszweck“ schreiben [z.B. A479, Thomas Kapplmüller, 080167]

Projektstand Mai 2025

Bundesdenkmalamt (BDA) ist an Bord



Projekt-Nummer A479 wird für Gesamtprojekt verwendet

- Projektnummer war original nur für „Sanierung Dach/Dachstuhl“ vom BDA vergeben, somit nur befristet verwendbar.
- Auf Anfrage Ende Mai bestätigt das BDA
 - Die Projektnummer gilt für das gesamte Sanierungsprojekt
 - Es gibt keine zwischenzeitliche Einschränkung ... alles, was gespendet wird, kommt dem Projekt zugute ... entsprechend den laufenden Ausgaben.
 - Lediglich muss die Pfarre rechtzeitig formal ansuchen, jede folgende Bauetappe dem Projekt zuzuschreiben (z.B. 2026: Fenstersanierung + Steinmetzarbeiten + Lüftungstechnik nachrüsten)

Projektstand Mai 2025

Noch ein beeindruckendes Bild ...

Bauetappe 1 Sanierung Kanäle

- Riesige Wurzelstränge hatten sich in die Verrohrung eingewachsen



Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit



Bauetappe 1 Sanierung Glocken

- Für Ende Juni hat sich die Fa. Perner zur Montage neuer Klöppel und des Läutwerks angesagt.
- Ergänzend wird die Uralt-Elektrik erneuert.
- Gesamtbudget Euro 18.000,-

- Bilder werden nachgereicht

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit



Bauetappe 1 - Sanierung Dachstuhl

- Nach wiederholter Begehung, Digitaler 3D-Vermessung und Expertengutachten durch Fa. Weilhartner steht (neben ein paar „Kleinigkeiten“) fest:
 - Die fehlenden Mauerbänke müssen nachgerüstet werden
 - Das teilweise Aufliegen der Dachstuhlkonstruktion auf dem Gewölbe muss unbedingt behoben werden.
- Durch Dachöffnung sind die Teile einer Stahlkonstruktion einzubringen > an Ort und Stelle zu montieren > der Dachstuhl zu heben ... Skizzen dazu auf den nächsten Seiten
- Budget rund Euro 100.000,-

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit



Bauetappe 1 - Sanierung Dachstuhl – Skizzen

Das Problem

Mauerbank fehlt
Dachstuhl liegt auf

Die Lösung: Den Dachstuhl mittels Stahlkonstruktion heben

Prinzip-Skizze

- Dachstuhl
- Mauern, Säulen
- Stahlkonstruktion
- Auflager, Befestigung

Kirchenschiff

Altarraum

Draufsicht

Kirchenschiff

Altarraum

Seitenansicht

Skizzen in Anlehnung an Detailpläne der Fa. Weilhartner


Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit

Prinzip der Stahlkonstruktion

Blick aus dem hinteren Teil des Langschiffs
Richtung Einstieg / Stiegenaufgang.

Mittels dieser Konstruktion wird der Dachstuhl angehoben. Danach werden fehlende Teile der Mauerbänke (Lärchenpfosten) eingebracht. Und der Dachstuhl liegt schließlich nicht mehr auf dem Gewölbe auf.

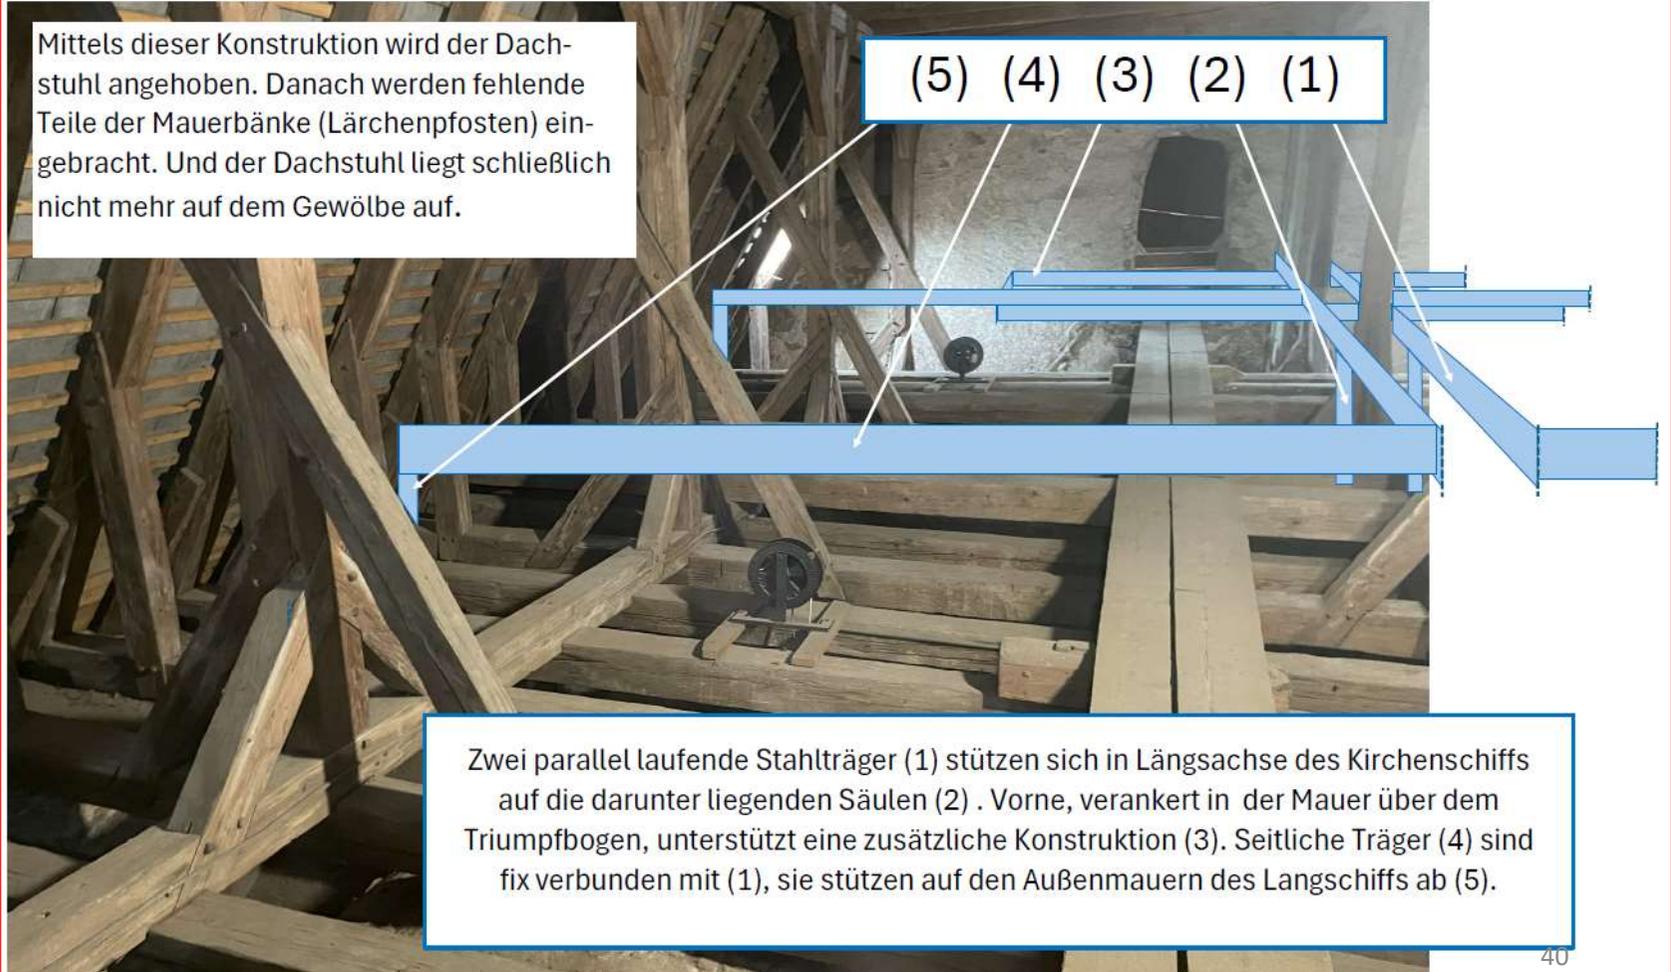

Zwei parallel laufende Stahlträger (1) stützen sich in Längsachse des Kirchenschiffs auf die darunter liegenden Säulen (2). Vorne, verankert in der Mauer über dem Triumphbogen, unterstützt eine zusätzliche Konstruktion (3). Seitliche Träger (4) sind fix verbunden mit (1), sie stützen auf den Außenmauern des Langschiffs ab (5).

Projektstand Mai 2025

Aktuell in Arbeit



Bauetappe 1 - Sanierung Dachstuhl

- Die Bauarbeiten im Dachraum werden voraussichtlich Ende August / Anfang September 2025 durchgeführt werden
- Aus Sicherheitsgründen wird im Zuge dieser Maßnahmen die Kirche für einige Tage gesperrt sein.

Projektstand Mai 2025

Spenden und Zusagen bis 2027



Die Tafel - unser Dank an großzügige Spender



Spenden und Zusagen bis 2027.

Gemeinde
Betriebe
Private
Vereine
Veranstaltungen

Projektstand Mai 2025

Spenden und Zusagen bis 2027



Was läuft besonders gut

- Die Spendenzusagen der Betriebe und großen privaten Gönner übertreffen unsere Hoffnungen um das Doppelte.
- Spenden von Vereinen, gewidmete Veranstaltungen, Festeinnahmen und aus Begräbnissen liegen auch 70% höher als abgeschätzt.

Wo zwickt es uns ein wenig auf der Einnahmenseite

- Zeit und Ressourcen für flächendeckenden und qualitativ ansprechenden Hausbesuch haben wir ehrlich unterschätzt ... uns fehlen immer noch ca. 30% der Haushalte. Das erhoffte Ergebnis werden wir voraussichtlich um 20% verfehlen.

Insgesamt liegen wir bei den Spenden ca. 30% über Plan

Projektstand Mai 2025



*Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA)
und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)*

Vom ersten Ansuchen > über eigenen Vorstellungen > zum finalen Plan

- Schließlich haben sich die drei entscheidenden Fachverantwortlichen mit unseren Vorstellungen (Seite 14, 26 - 29) im Detail auseinandergesetzt.
- Nun hat die Pfarre endlich ein Gesamtbild
 - Was dürfen wir auf keinen Fall
 - Was ist genehmigt
 - Was muss noch weiter beraten werden.
- Fest steht auf alle Fälle die nächste Bauetappe:
 - Fenstersanierung + Steinmetzarbeiten + Lüftungstechnik nachrüsten
 - Geplant für KJ2026; terminliche Freigabe durch Diözese Linz steht noch aus.

Projektstand Mai 2025

Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA) und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)



Was muss noch **weiter beraten** werden

- Beim Thema Beamer bzw. Bildschirme sehen wir intern noch weiteren Gesprächsbedarf.
- Unsere Vorstellungen des Feier-Raumes unter der Orgel-Empore teilen die Fachleute nicht wirklich und schlagen alternative Lösungen (Seitenschiff) vor; voraussichtlich werden wir aber auf unserem Wunsch beharren. Ausgang offen.
- Zeit- und Umsetzungsplan sind auf Grund der geänderten Budgetdetails (Seite 44) neu zu ordnen. Dazu haben wir in den kommenden Monaten ausreichend Zeit.

Projektstand Mai 2025

*Ortsaugenschein 27.3. mit Diözesenkonservatorin, Landeskonservator (BDA)
und Team Diözesanes Bauen (vormals: AKB – Abt. Kirchliches Bauen)*



Was dürfen wir **auf keinen Fall**

- Eigentlich wollten wir die Raumschale nur reinigen und mit vergüteter Farbe ausmalen. Nein!
 - Wir müssen die 1985 aufgetragene Dispersionsfarbe abnehmen.
 - Danach mehrfach Ausmalen in Kalk-Technik.
 - Lt. früherer Gutachten verhindert die Dispersion ein Atmen von Putz und Mauerwerk; über Zeit tritt massive Schädigung ein.
 - Mehrpreis im Budget rund Euro 80.000,-
- Sakristei und Grafenstuhl sind tabu – keine Umbauten gestattet. Auch das Versetzen der Stufen im Altarraum Richtung Volk ist unmöglich
 - Minderpreis im Budget knapp Euro 300.000,-
- Erforderlicher Neuverputz darf nicht von der Liste gestrichen werden.

Projektstand Mai 2025

Zusammenfassung



Grund zur Freude ... und noch viel Arbeit vor uns

- Die Entwicklung des Spendenstands und die Minderausgaben nach dem Ortsaugenschein machen Hoffnung für das Gesamtprojekt; eventuell kommen wir auch ohne weitere Streichungen durch.
- Die Zusage seitens Bundesdenkmalamt für das dauerhaft offene Projekt-Konto A479 nimmt uns die Sorge einer aufwändigen Spender-Kommunikation und Koordination.
- Die Abarbeitung aller Projektphasen in überschaubarer Zeit (mindestens 2028) mit den freizugebenden Ressourcen und Mitteln seitens Diözese wird noch eine große Herausforderung.

Projektstand Mai 2025

Ein Blick in die Zukunft



Das erwarten wir im Kalenderjahr 2026

- Nach Freigabe durch die diözesanen Gremien im Spätherbst 2025 sollten wir im Jahr darauf Fenstersanierung, Steinmetz-Arbeiten und Nachrüstung Lüftungstechnik bewerkstelligen.
- Im März / April 2026 werden die Arbeitsgruppen Raum und Bau wieder zusammentreten für die Detailplanung ab KJ2027
 - Überarbeitung der Entscheidungen aus Dezember 2023 (wir müssen + wir wollen, siehe Seite 14)
 - Unter Berücksichtigung notwendiger Anpassungen nach Ortsaugenschein (siehe Seite 44 – 47).



... Fortsetzung folgt
